

23. Etappe: 5 Wochen Bauzeit  
 - Belegabdruck  
 - Werkarbeiten Wasser und Gas  
 - Tiefbauarbeiten Erdabstimmung, lokale Anpassung Kanalisation  
 - Fundamentschicht  
 - Fundamentmauerwerk  
 - Einbau ACP

22. Etappe: 5 Wochen Bauzeit mit Strassenpermpung  
 - Belegabdruck  
 - Werkarbeiten Wasser, Gas und Kabelwerke  
 - Tiefbauarbeiten Erdabstimmung, lokale Anpassung Kanalisation  
 - Fundamentschicht  
 - Fundamentmauerwerk  
 - Einbau ACP

21. Etappe: 5 Wochen Bauzeit  
 - Belegabdruck  
 - Werkarbeiten Erdabstimmung, lokale Anpassung Kanalisation  
 - Fundamentschicht  
 - Fundamentmauerwerk  
 - Einbau ACP

20. Etappe: 5 Wochen Bauzeit  
 - Belegabdruck  
 - Werkarbeiten Erdabstimmung, lokale Anpassung Kanalisation  
 - Fundamentschicht  
 - Fundamentmauerwerk  
 - Einbau ACP

19. Etappe: 5 Wochen Bauzeit  
 - Belegabdruck  
 - Werkarbeiten Erdabstimmung, lokale Anpassung Kanalisation  
 - Fundamentschicht  
 - Fundamentmauerwerk  
 - Einbau ACP

18. Etappe: 5 Wochen Bauzeit  
 - Belegabdruck  
 - lokale Ergänzungen Werkarbeiten  
 - Tiefbauarbeiten Erdabstimmung, lokale Anpassung Kanalisation  
 - Fundamentschicht  
 - Fundamentmauerwerk  
 - Einbau ACP

17. Etappe: 3 Wochen Bauzeit  
 - Belegabdruck  
 - Werkarbeiten Kabelwerke  
 - Tiefbauarbeiten Erdabstimmung, lokale Anpassung Kanalisation  
 - Fundamentschicht  
 - Fundamentmauerwerk  
 - Einbau ACP

16. Etappe: 3 Wochen Bauzeit  
 - Belegabdruck  
 - Tiefbauarbeiten Erdabstimmung, lokale Anpassung Kanalisation  
 - Fundamentschicht  
 - Fundamentmauerwerk  
 - Einbau ACP

15. Etappe: 3 Wochen Bauzeit  
 - Belegabdruck  
 - Tiefbauarbeiten Erdabstimmung, lokale Anpassung Kanalisation  
 - Fundamentschicht  
 - Fundamentmauerwerk  
 - Einbau ACP

14. Etappe: 3 Wochen Bauzeit  
 - Belegabdruck  
 - Tiefbauarbeiten Erdabstimmung, lokale Anpassung Kanalisation  
 - Fundamentschicht  
 - Fundamentmauerwerk  
 - Einbau ACP

13. Etappe: 3 Wochen Bauzeit  
 - Belegabdruck  
 - Tiefbauarbeiten Erdabstimmung, lokale Anpassung Kanalisation  
 - Fundamentschicht  
 - Fundamentmauerwerk  
 - Einbau ACP

12. Etappe: 3 Wochen Bauzeit  
 - Belegabdruck  
 - Tiefbauarbeiten Erdabstimmung, lokale Anpassung Kanalisation  
 - Fundamentschicht  
 - Fundamentmauerwerk  
 - Einbau ACP


11. Etappe: 3 Wochen Bauzeit  
 - Belegabdruck  
 - Tiefbauarbeiten Erdabstimmung, lokale Anpassung Kanalisation  
 - Fundamentschicht  
 - Fundamentmauerwerk  
 - Einbau ACP

10. Etappe: 3 Wochen Bauzeit  
 - Belegabdruck  
 - Tiefbauarbeiten Erdabstimmung, lokale Anpassung Kanalisation  
 - Fundamentschicht  
 - Fundamentmauerwerk  
 - Einbau ACP

9. Etappe: 3 Wochen Bauzeit  
 - Belegabdruck  
 - Tiefbauarbeiten Erdabstimmung, lokale Anpassung Kanalisation  
 - Fundamentschicht  
 - Fundamentmauerwerk  
 - Einbau ACP

8. Etappe: 3 Wochen Bauzeit  
 - Belegabdruck  
 - Tiefbauarbeiten Erdabstimmung, lokale Anpassung Kanalisation  
 - Fundamentschicht  
 - Fundamentmauerwerk  
 - Einbau ACP

7. Etappe: 3 Wochen Bauzeit  
 - Belegabdruck  
 - Tiefbauarbeiten Erdabstimmung, lokale Anpassung Kanalisation  
 - Fundamentschicht  
 - Fundamentmauerwerk  
 - Einbau ACP

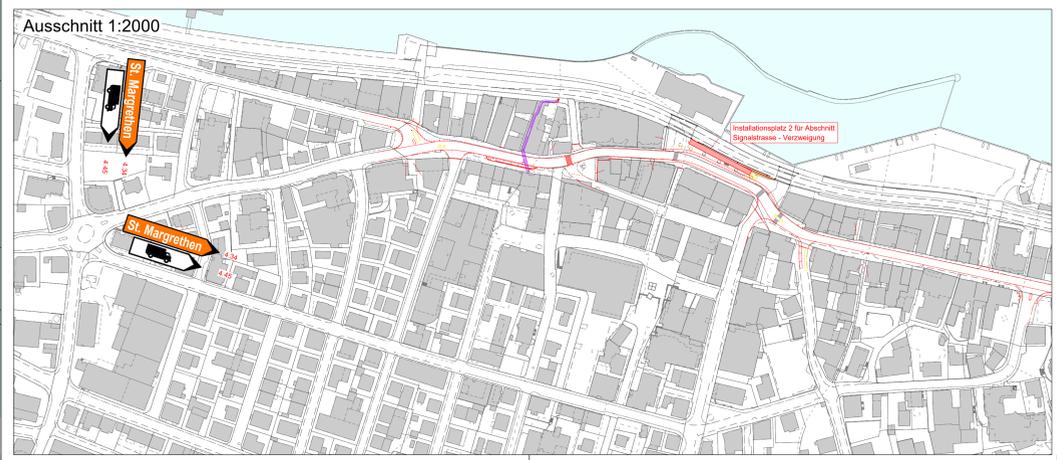

Kanton St. Gallen Baudepartement Tiefbauamt			
Kantonstrasse	Nr. 1, Rorschach - Rheineck	5	
Gemeinde	Rorschach		
Bauobjekt	Strassenraumgestaltung Zentrum Abschnitt St. Gallerstrasse - Kirchstrasse		
Plan, Massstab	Situation Bauetappen mit Verkehrsführung West 1:200	ENTWURF	
RMS-Kilometer	11.315 - 11.900		
Projektverfasser	HERSCHE INGENIEURE AG Dorfstrasse 20 9413 Obereggen	Genehmigungsvermerke	vom TBA freigegeben
T 071 898 80 52 F 071 898 80 50 oberegg@herscheping.ch www.herscheping.ch			
Plan Nr. 05.14.02	Ausfertigung für	Format	60 x 168 cm
Konto Nr. B13 1.001.241		Fläche	1.01 m <sup>2</sup>
Vorstudie	Entwurf	Gezeichnet	Geprüft
Vorprojekt	J	ma	J
Bauplan			
Genehmigungs- / Auflageprojekt			
Ausschreibung			
Ausführungsprojekt			
Dok. des ausgeführten Werks			
		Datum	30.09.2020
